

Utbyggnad VA Hyndevad v.40-41- 2023

Sandbankarna:

- VA-arbeten i väg 2, 3 samt mellan väg 4 och badplatsen.
- VA-arbeten i grönyta nord-östra delen.
- EL och Fiber-arbeten väg 7.

Hyndevadstrand:

- VA-arbeten vid pumpstationen mellan Hyndevadstrand och Närsjö.
- VA-arbeten från Hyndevadstrand 1 och västerut.

Närsjö:

- Schakt och montage pumpstation mellan Närsjö och Närsjö Gård.

Dalhagen:

- VA-arbeten västra vägen mot Östergård, norr om Albrovägen.
- VA-arbeten i Albrovägen, väster om Skogavägen.
- VA-arbeten i Albrovägen, väster om Dalhagsvägen.
- Hammarborrning väster om korsningen Skogavägen/Rv230.

Sandhem/Borsökna:

- Sandhemsvägen, VA-arbeten i samt vägöverbyggnad.
- Borsöknäsvägen, VA-arbeten i samt vägöverbyggnad.
(Endast 1 körfält och trafikljus).
- Närsjövägen, VA-arbeten från vändplanen och västerut.
- *Vecka 41 (9/10) påbörjas sjöledningsarbeten vid stora badet.*



Pågående Arbeten v.40-v.41

- VA-förläggning: Sträcka 6, 3 och 1:1. Eventuellt str 5 om vi blir klara på 3
- El & fiber-förläggning: Sträcka 1:1

Övrig information

Sprängningsarbeten kan förekomma vissa dagar, ljudande signal före & efter sprängning

Daniel Enroth, Arbetsledare Salboheds. 070-2088294

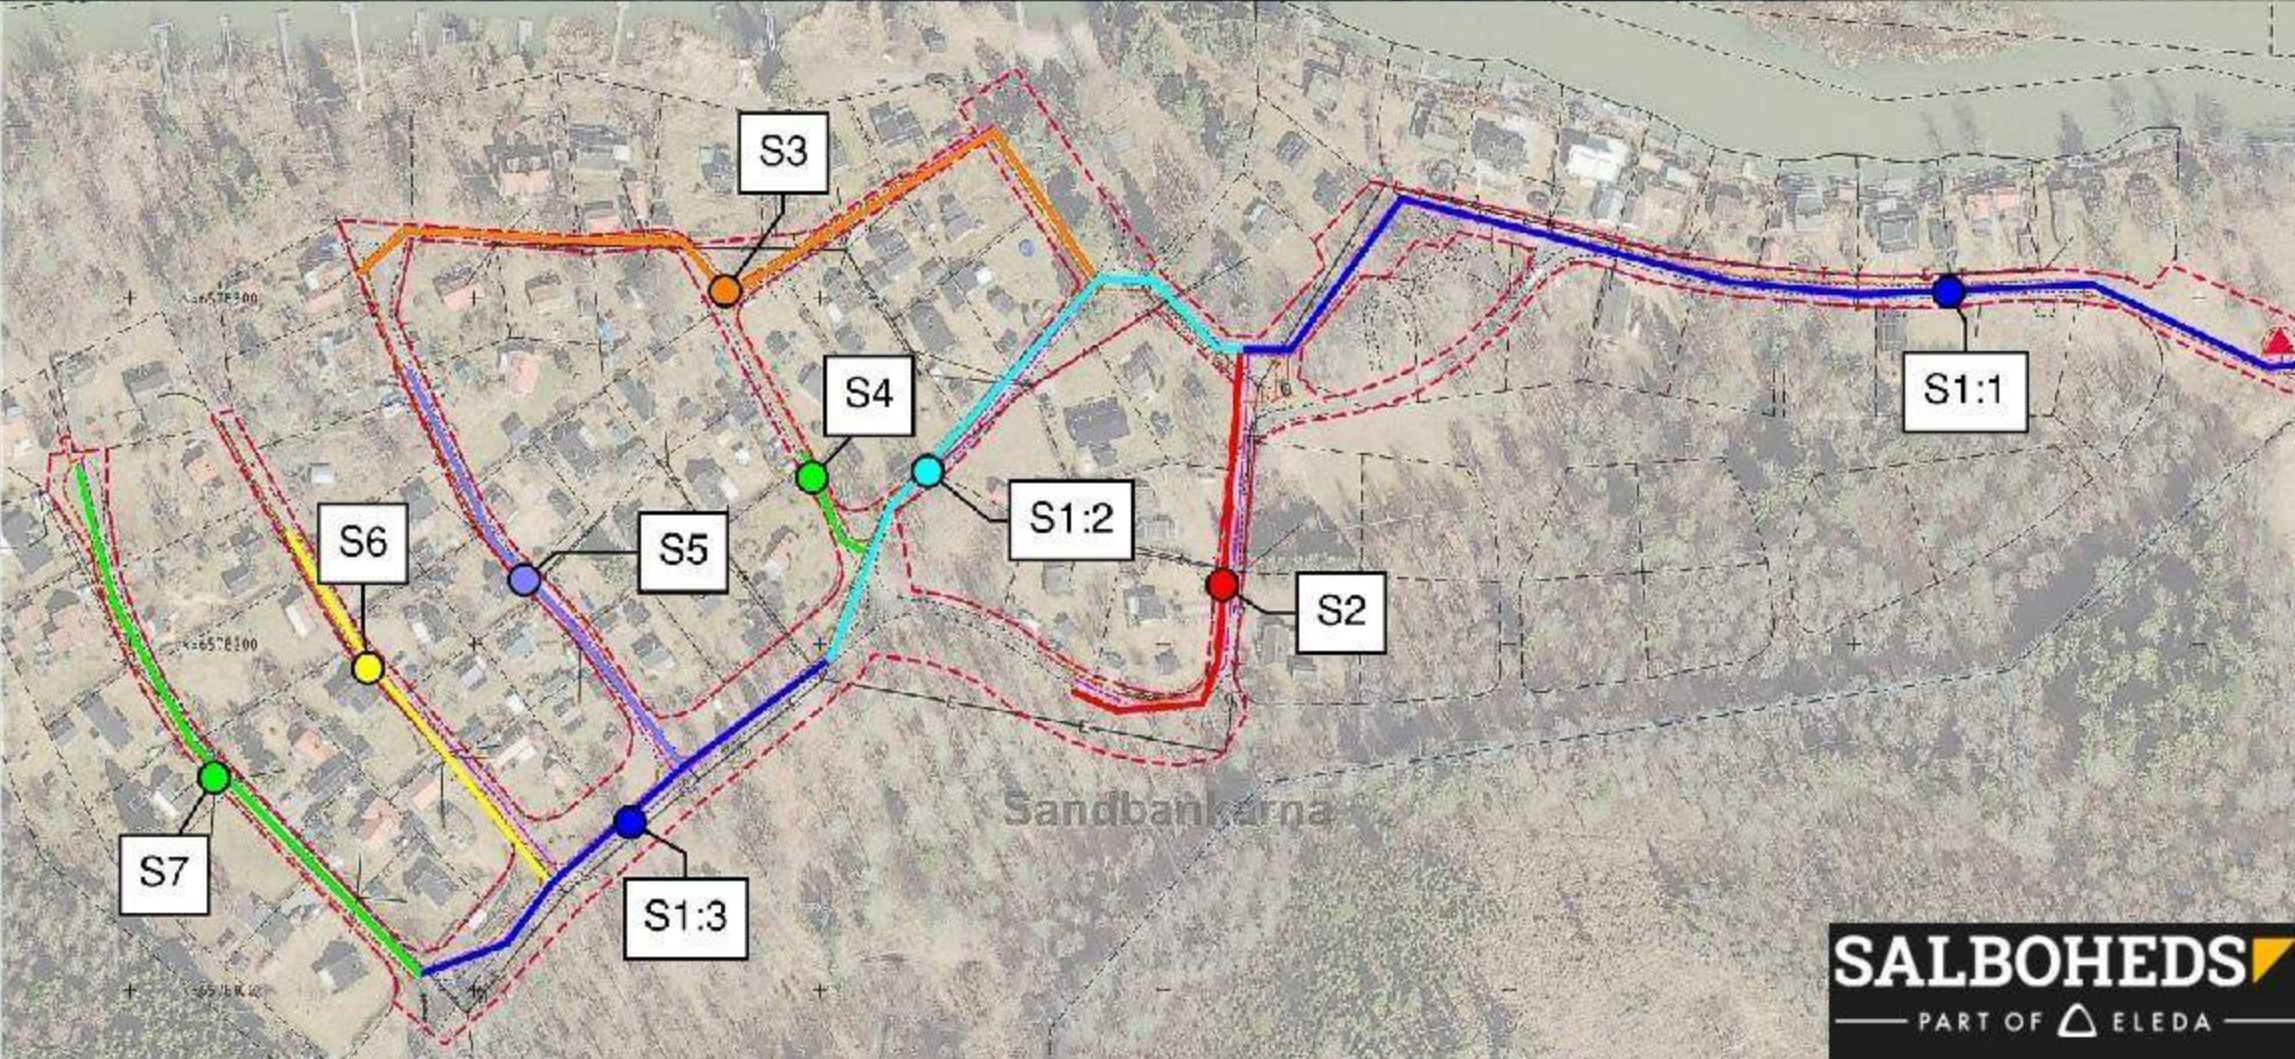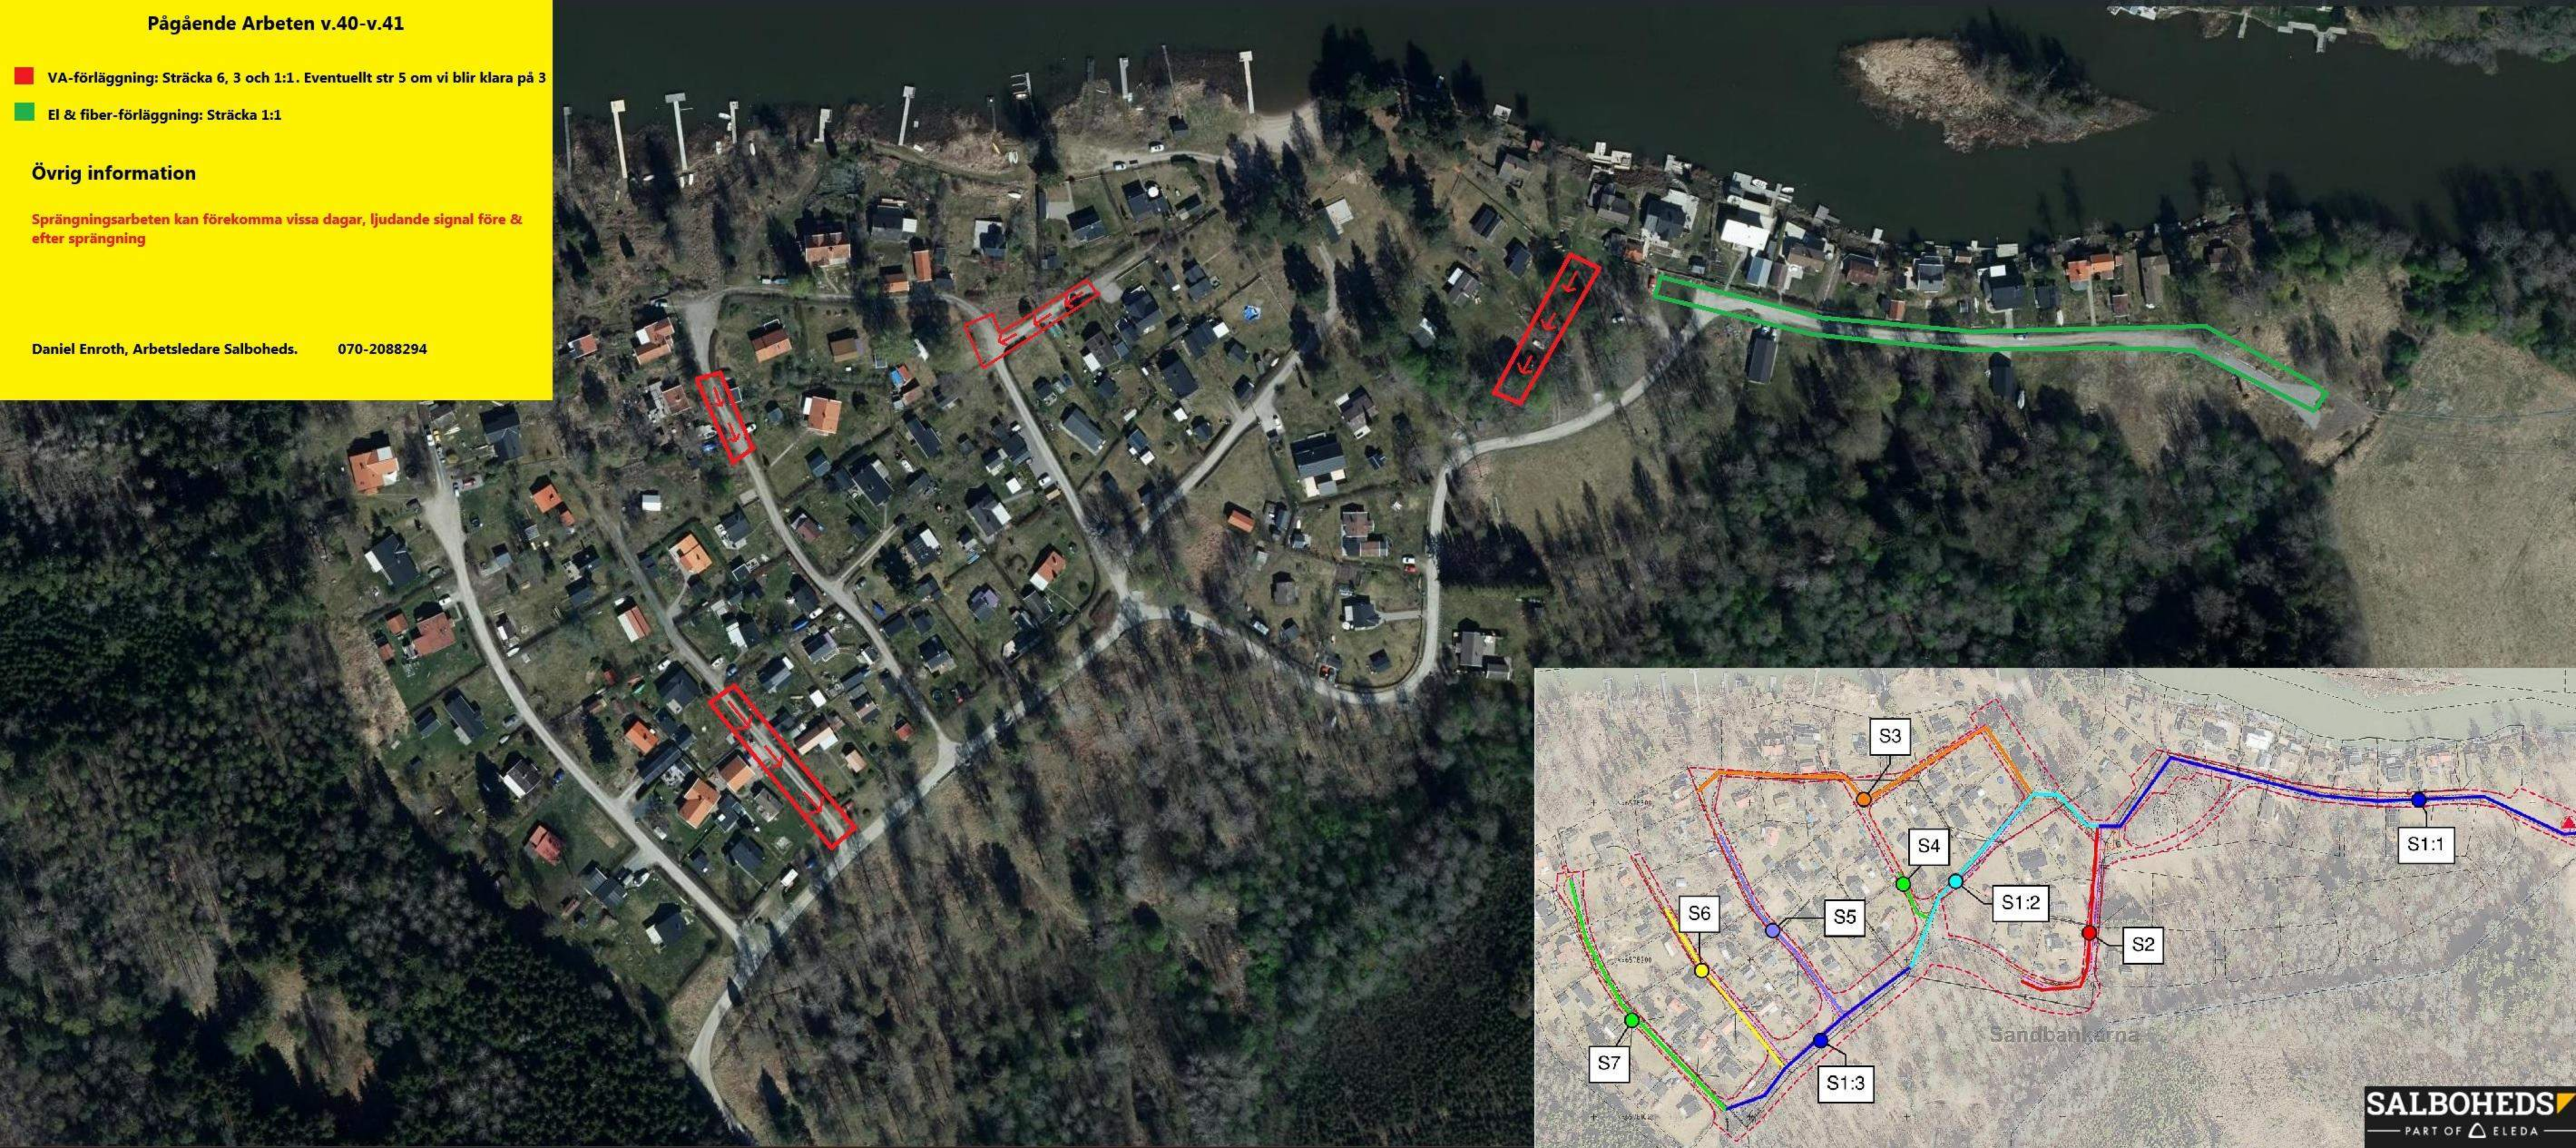

Bukettvägen avstängd 500 meter längre ner. Följ orange hänvisning för att ta alternativ väg, markerat i blått.

- Postlådor

Hyndevadstrand

Kommande arbeten V.40-V41

Vi är på 3 ställen och utför arbeten.

Vissa fastighetsägare blir mer drabbade än andra pga att vi gräver precis utanför deras infart.

I vilken ände av Dalhagen man som fastighetsägare får köra ut kan variera från dag till dag beroende på hur det dagliga arbetet utvecklas.

